


Presupuesto Ejercido

Octubre - Diciembre 2006

136.0 Millones de Pesos

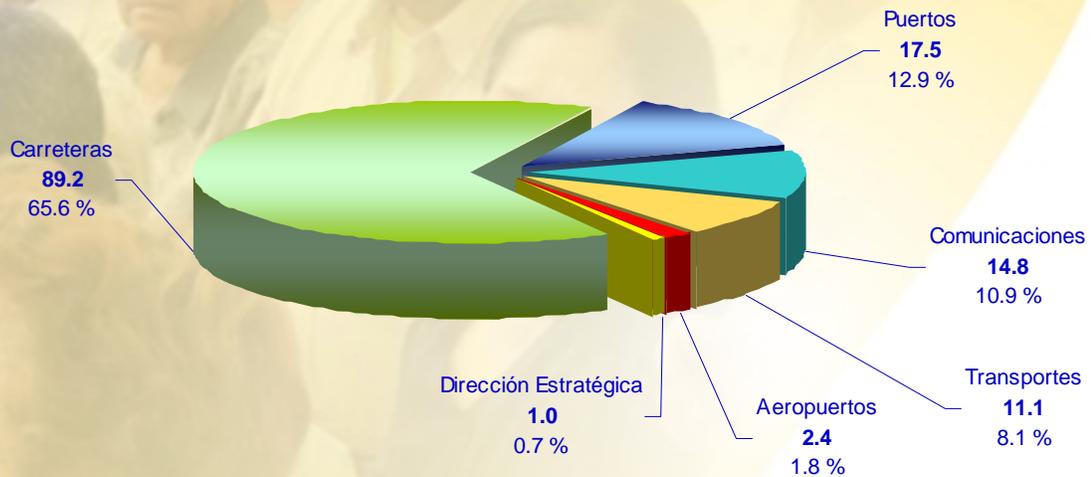

Fuente: Organismos Públicos del Gobierno del Estado

Comunicaciones y Transportes



SUBFUNCIÓN: CARRETERAS

ENTIDAD: Comisión de Caminos

ACCIONES Y RESULTADOS

CAMINOS REALIZADOS OCTUBRE - DICIEMBRE 2006

COBERTURA ESTATAL

MUNICIPIO /OBRA /TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	PROGRAM. ANUAL	METAS		% AVAN FÍSICO. 4to.TRIM.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
				ALCAN. AL 3er.	TRIM. 4to.		TOTAL	TIPO	

Fuente de Financiamiento:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

Modalidad: Contrato

Caminos Rurales									
Reconstrucción y Conservación									
Estado									
Apoyo a la Infraestructura Caminera Rural	Km.	Reconstrucción	600.00	294.00	342.00	106.00	1 500 000	Habitante	Estado
		Conservación	220.00	147.40	95.60	110.45			
Estado									
Apoyo a la Infraestructura Caminera Rural	Km.	Reconstrucción	600.00	294.00	342.00	106.00	1 500 000	Habitante	Estado
		Conservación	220.00	147.40	95.60	110.45			

Fuente de Financiamiento:

Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

Modalidad: Contrato

Caminos Rurales									
Adquisiciones									
Estado									
Programa de Reconstrucción de la Infraestructura Caminera del Estado	Pieza	Vehículos	21.00	21.00		100.00	10 000	Habitante	Estado
(Adquisición de vehículos, equipo de radiocomunicación y cómputo)	Pieza	Equipo Móvil de Radiocomunicación	4.00	4.00					
	Pieza	Equipo Base de Radiocomunicación	20.00	20.00					
	Pieza	Computadoras HP	20.00	20.00					
	Pieza	No Brake Micro Serial 500	24.00	24.00					
	Pieza	Impresoras de Inyección de Tinta HP	15.00	15.00					
	Pieza	Matriz Epson	5.00	5.00					
	Pieza	Escaner	2.00	2.00					
	Pieza	Motocicletas	2.00	2.00					
Estado									
Apoyo Institucional a Municipios (Traslado de Tubos)	M.L.	Tubería	51,800.00	36,413.00		70.30	637 012	Habitante	Estado

a/ Se pagaron viaticos al personal operativo por el traslado de la tubería y por problemas sociales en los complejos pemex no se cumplieron las metas.

REGIÓN I CENTRO

MUNICIPIO /OBRA /TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	PROGRAM. ANUAL	METAS		% AVAN FÍSICO. 4to.TRIM.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
				ALCAN. AL 3er.	TRIM. 4to.		TOTAL	TIPO	

Fuente de Financiamiento:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Modalidad: Contrato

Carreteras Alimentadoras									
Ocozocoautla de Espinosa									
Camino: Ocozocoautla de Espinosa - Apic Pac	Km.	Reconstrucción	54.00	43.20	10.80	100.00	78 786	Habitante	Ocozocoautla de Espinosa, Apic Pac
Tramo: Km. 0+000 - Km. 54+000 (T.A.)		Obras de Drenaje	54.00	43.20	10.80				
		Pavimento	54.00	43.20	10.80				
Ocozocoautla de Espinosa									
Camino: Ocozocoautla - Domingo Chanona	Km.	Reconstrucción	30.00	30.00		100.00	78 786	Habitante	Ocozocoautla de Espinosa, El Cielito
Tramo: Km. 0+000-Km. 51+200 (T.A.)		Obras de Drenaje	30.00	30.00					
Sub'tramo: Km. 0+000-Km. 30+000 (T.A.)		Pavimento	30.00	30.00					
Chicoasén									
Camino: Chicoasén - Tecpatán - Malpaso	Km.	Reconstrucción	98.20	98.20		100.00	24 356	Habitante	Chicoasén, Tecpatán
Tramo: Km. 0+000 - Km. 98+200 (T.A.)		Obras de Drenaje	98.20	98.20					
		Pavimento	98.20	98.20					
Tuxtla Gutiérrez									
Camino: Escuela Veterinaria - Ejido Emiliano Zapata	Km.	Reconstrucción	4.10	2.80	1.30	100.00	515 432	Habitante	Tuxtla Gutiérrez, Emiliano Zapata
Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+100 (T.A.)		Obras de Drenaje	4.10	2.80	1.30				
		Pavimento	4.10	2.80	1.30				



MUNICIPIO /OBRA /TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	PROGRAM. ANUAL	METAS		% AVAN FISICO. 4to.TRIM.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
				ALCAN. AL 3er.	TRIM. 4to.		TOTAL	TIPO	
Chiapa de Corzo		Reconstrucción							
Camino: Betania - Soyatitán - Amatenango del Valle	Km.	Terracerías	111.80	93.90	17.90	100.00	28 700	Habitante	Venustiano Carranza
Tramo: Km. 0+000-Km. 147+900		Obras de Drenaje	111.80	93.90	17.90				
Subtramo: Betania-Soyatitán		Pavimento	111.80	93.90	17.90				
Subtramo: Km. 0+000-Km. 111+800									
Nicolás Ruiz		Construcción							
Camino: Nicolás Ruiz - E.C. (Betania - Soyatitán)	Km.	Terracerías	17.10	2.40	14.70	100.00	3 580	Habitante	Varias
Tramo: Km. 0+000 - Km. 17+100 (T.A.)		Obras de Drenaje	17.10	2.40	17.70				
		Pavimento	17.10	2.40	17.70				
Venustiano Carranza		Reconstrucción							
Camino: Angostura - Flores Magón	Km.	Terracerías	7.20	3.60	3.60	100.00	1 500	Habitante	Acala, Flores Magón
Tramo: Km. 54+000 - Km. 61+200 (T.A.)		Obras de Drenaje	7.20	3.60	3.60				
		Pavimento	7.20	3.60	3.00				
Cintalapa		Reconstrucción							
Camino: Ramal a Pomposo Castellanos	Km.	Terracerías	4.60	4.60		a/ 100.00	70 182	Habitante	Cintalapa de Figueroa
Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+600 (T.A.)		Obras de Drenaje	4.60	4.60					
		Pavimento	4.60	4.60					

Fuente de Financiamiento:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)

Modalidad: Contrato

Carreteras Alimentadoras									
Jiquipilas		Reconstrucción							
Camino: Santa Isabel - Villaflores - Revolución Mexicana. Tramo: Km. 0+000-Km. 124+000 (T.A.)	Km.	Terracerías	45.00	45.00		100.00	46 009	Habitante	Santa Isabel, El Ocote, Francisco Villa
Subtramo: Km. 0+000-Km. 45+000		Obras de Drenaje	45.00	45.00					
		Pavimento	45.00	45.00					
Jiquipilas		Reconstrucción							
Camino: Santa Isabel - Villaflores - Revolución Mexicana. Tramo: Km. 0+000-Km. 124+000 (T.A.)	Km.	Terracerías	45.00	45.00		100.00	46 009	Habitante	Santa Isabel, El Ocote, Francisco Villa
Subtramo: Km. 0+000-Km. 45+000		Obras de Drenaje	45.00	45.00					
		Pavimento	45.00	45.00					

Fuente de Financiamiento:

Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Modalidad: Contrato

Carreteras Alimentadoras									
Venustiano Carranza		Reconstrucción							
Camino: Angostura - Flores Magón	Km.	Terracerías	7.20	4.70	2.50	100.00	1 500	Habitante	Acala, Flores Magón
Tramo: Km. 54+000 - Km. 61+200 (T.A.)		Obras de Drenaje	7.20	4.70	2.50				
		Pavimento	7.20	4.70	2.50				
Chiapa de Corzo		Reconstrucción							
Camino: Salvador Urbina - Julian Grajales	Km.	Terracerías	19.10	8.40		a/ 43.98	3 800	Habitante	Acala
Tramo: Km. 0+000 - Km. 19+100 (T.A.)		Obras de Drenaje	19.10	8.40					
		Pavimento	19.10	8.40					
Chiapilla		Reconstrucción							
Camino: San Lucas - Chiapilla	Km.	Terracerías	11.70	0.00	11.70	100.00	7 580	Habitante	Lázaro Cárdenas, Chiapilla, San Lucas
Tramo: Km. 0+000 - Km. 11+700 (T.A.)		Obras de Drenaje	11.70	0.00	11.70				
		Pavimento	11.70	0.00	11.70				

a/ Obra cancelada por rescisión de contrato.

Fuente de Financiamiento:

Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)

Modalidad: Contrato

Carreteras Alimentadoras									
Suchiapa		Construcción							
Camino: Tuxtla Gutiérrez - Villaflores - E.C. Nuevo Aeropuerto (Ampliación)	Km.	Terracerías	0.551	0.00	0.551	100.00	18 550	Habitante	Venustiano Carranza
Su'tramo: Km. 0+000 - Km. 0+261		Subrasante	0.551	0.00	0.551				
Km. 0+000 - Km. 0+141 y Km. 0+000 - Km. 0+149		Obras de Drenaje	0.551	0.00	0.551				
		Base Hidráulica	0.551	0.00	0.551				
		Carpeta Asfáltica	0.551	0.00	0.551				
		Sello	0.551	0.00	0.551				
Suchiapa		Construcción							
Camino: Tuxtla Gutiérrez - Villaflores - E.C. Nuevo Aeropuerto (Ampliación)	Km.	Señalamiento	0.551	0.00	0.551	100.00			



MUNICIPIO /OBRA /TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	PROGRAM. ANUAL	METAS		% AVAN FÍSICO. 4to.TRIM.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
				ALCAN. TRIM. AL 3er.	4to.		TOTAL	TIPO	

Fuente de Financiamiento:

Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)

Modalidad: Contrato

Carreteras Alimentadoras									
Reconstrucción									
Chiapa de Corzo									
Camino: Las Limas - Revolución Mexicana - Valdivia	Km.	Terracerías	30.00	10.80		a/ 36.00	64 098	Habitante	Salvador Urbina, América Libre, Narcizo Mendoza
Tramo: Km. 17+000 - Km. 145+300 (T.A.)		Obras de Drenaje	30.00	10.80					
Sub'tramo: Km. 17+000 - Km. 47+000 (T.A.)		Pavimento	30.00	10.80					

a/ Obra cancelada por rescisión de contrato.

Fuente de Financiamiento:

Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

Modalidad: Contrato

Caminos Rurales									
Construcción									
Nicolás Ruiz									
Camino: Nicolás Ruiz - Guadalupe Victoria (Construcción del Puente San Vicente en el Km. 0+402.82 de 40.0 Metros de Longitud)	M.L.	Subestructura (2 Estribos de mampostería de 3a.)	40.00	40.00		100.00	4 300	Habitante	Varias
		Superestructura (Losa de concreto armado)	40.00	40.00					
		Aproches	40.00	40.00					
		Terracerías	40.00	40.00					
		Revestimiento	40.00	40.00					
		Obras Complementarias	40.00	40.00					

Fuente de Financiamiento:

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)

Modalidad: Contrato

Obras Viales									
Reconstrucción									
Chiapa de Corzo									
Camino: Perimetral del Aeropuerto "Ángel Albino Corzo"	Km.	Terracerías	14.154	3.568	10.586	100.00	29 341	Habitante	Chiapa de Corzo
Tramo: Km. 0+000 - Km. 14+154.36		Obras de Drenaje							
		Revestimiento							
Tuxtla Gutiérrez									
Camino Prolongación Boulevard Aeropuerto-Escuela Veterinaria	Km.	Terracerías	5.10	5.10	5.10	100.00	515 432	Habitante	Tuxtla Gutiérrez
Tramo: Km. 0+000- Km. 5+100		Obras de Drenaje	5.10	5.10	5.10				
		Pavimento	5.10	5.10	5.10				

Fuente de Financiamiento:

Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

Modalidad: Contrato

Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo									
Tuxtla Gutiérrez									
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	Mantto. Correct.	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	32.00	22.00	10.00	100.00	88	Trabajador	Varias
Tuxtla Gutiérrez									
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	Mantto. Prevent.	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	188.00	130.00	58.00	100.00	88	Trabajador	Varias
Tuxtla Gutiérrez									
Mantenimiento y Reparación de Vehículos	Mantto. Correct.	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	18.00	13.00	5.00	100.00	188	Trabajador	Varias
Tuxtla Gutiérrez									
Mantenimiento y Reparación de Vehículos	Mantto. Prevent.	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	238.00	172.00	66.00	100.00	188	Trabajador	Varias
Cintalapa									
Camino Cintalapa-Cal y Mayor	K.m	Estudio y Proyecto	6.66	6.66	6.66	100.00	35 550	Habitante	Varias
Tramo: Km. 0+000- Km. 10+700		Impacto Ambiental	6.66	6.66	6.66				
Subtramo: Km. 4+040- Km. 10+700									



REGIÓN II ALTOS

MUNICIPIO /OBRA /TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	PROGRAM. ANUAL	METAS		% AVAN FÍSICO. 4to.TRIM.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
				ALCAN. AL 3er.	TRIM. 4to.		TOTAL	TIPO	
Fuente de Financiamiento:									
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social									
Modalidad: Contrato									
Carreteras Alimentadoras									
Reconstrucción									
Chanalhó									
Camino: San Juan Chamula - Chenalhó - Pantelhó	Km.	Terracerías	59.50	59.50		100.00	32 094	Habitante	San Juan Chamula, Chanalhó, Pantelhó
		Obras de Drenaje	59.50	59.50					
Tramo: Km. 0+000 - Km. 59+500 (T.A.)		Pavimento	59.50	59.50					
Tenejapa									
Reconstrucción									
Camino: San Cristóbal - Tenejapa - Cancú	Km.	Terracerías	54.50	54.50		100.00	38 708	Habitante	San Cristóbal de las Casas, Tenejapa
		Obras de Drenaje	54.50	54.50					
Tramo: Km. 0+000 - Km. 54+500 (T.A.)		Pavimento	54.50	54.50					
Chamula									
Reconstrucción									
Camino: San Cristóbal de las Casas-San Juan Chamula	Km.	Terracerías	9.90	9.90		100.00	69 320	Habitante	San Juan Chamula, San Cristóbal de las Casas
		Obras de Drenaje	9.90	9.90					
Tramo: Km. 0+000 - Km. 9+900 (T.A.)		Pavimento	9.90	9.90					
Amatenango del Valle									
Reconstrucción									
Camino: Betania-Soyatitán-Amatenango del Valle	Km.	Terracerías	36.10		36.10	100.00	33 530	Habitante	Amatenango del Valle
		Obras de Drenaje	36.10		36.10				
Tramo: Km. 111+800-Km. 147+900		Pavimento	36.10		36.10				
Fuente de Financiamiento:									
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)									
Modalidad: Contrato									
Carreteras Alimentadoras									
Reconstrucción									
Amatenango del Valle									
Camino: Betania - Soyatitán - Amatenango del Valle	Km.	Terracerías	36.10	36.10		100.00	33 530	Habitante	Amatenango del Valle
		Obras de Drenaje	36.10	36.10					
Tramo: Km. 111+800 - Km. 147+900 (T.A.)		Pavimento	36.10	36.10					
Fuente de Financiamiento:									
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos									
Modalidad: Contrato									
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo									
San Cristóbal de las Casas									
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	Mantto. Correct.	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	12.00	9.00	3.00	100.00	56	Trabajador	Varias
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo									
San Cristóbal de las Casas									
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	Mantto. Prevent.	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	136.00	100.00	36.00	100.00	56	Trabajador	Varias
Mantenimiento y Reparación de Vehículos									
San Cristóbal de las Casas									
Mantenimiento y Reparación de Vehículos	Mantto. Correct.	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	7.00	4.00	3.00	100.00	26	Trabajador	Varias
Mantenimiento y Reparación de Vehículos									
San Cristóbal de las Casas									
Mantenimiento y Reparación de Vehículos	Mantto. Prevent.	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	98.00	44.00	54.00	100.00	26	Trabajador	Varias



REGIÓN III FRONTERIZA

MUNICIPIO /OBRA /TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	PROGRAM. ANUAL	METAS		% AVAN FÍSICO. 4to.TRIM.	BENEFICIARIOS TOTAL	TIPO	COMUNIDAD BENEFICIADA
				ALCAN. AL 3er.	TRIM. 4to.				
Fuente de Financiamiento:									
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social									
Modalidad: Contrato									
Carreteras Alimentadoras									
Reconstrucción									
Comitán de Domínguez									
Camino: Comitán - La Mesilla - Pujilic	Km.	Terracerías	57.10	8.60	48.50	100.00	123 915	Habitante	Comitán, La Mesilla, Pujilic
Tramo: Km. 0+000 - Km. 57+100 (T.A.)		Obras de Drenaje	57.10	8.60	48.50				
		Pavimento	57.10	8.60	48.50				
Construcción									
La Independencia									
Camino: Lázaro Cárdenas-EI Triunfo-La Independencia	M.L.	Pavimento y Trabajos Diversos	16.00	16.00		100.00	37 122	Habitante	La Independencia
Tramo: Km. 0+000 - Km. 30+000									
Puente S/N Km. 2+800									
Caminos Rurales									
Reconstrucción									
Las Margaritas									
Calles de la Realidad	M.L.	Terracerías	1,700.00	1,700.00		a/ 44.12	3 000	Habitante	La Realidad
		Obras de Drenaje	1,700.00	800.00					
		Revestimiento	1,700.00	0.00					
Reconstrucción									
Maravilla Tenejapa									
E.C. Fronteriza - Ejido Causas Verdes - Las Nubes	Km.	Terracerías	13.00	3.25	9.75	100.00	1 250	Habitante	Varias
Tramo: Km. 0+000 - Km. 13+000		Obras de Drenaje	13.00	3.25	9.75				
		Revestimiento	13.00	3.25	9.75				
Reconstrucción									
Las Margaritas									
Camino: Acceso a San Quintin	Km.	Terracerías	23.00	14.03	6.21	b/ 88.00	5 000	Habitante	La Realidad, Carmen Villaflores
Tramo: Km. 0+000 - Km. 38+000 (T.A.)		Obras de Drenaje	23.00	14.03	6.21				Nueva
Subtramo: Km. 15+000 - Km. 38+000 (T.A.)		Pavimento	23.00	14.03	6.21				Providencia, Guadalupe Tepeyac
Carreteras Alimentadoras									
Reconstrucción									
Altamirano									
Camino: Cushulja - Altamirano	Km.	Terracerías	22.00	16.50	5.50	100.00	25 932	Habitante	Cushulja, Altamirano
Tramo: Km. 0+000 al 22+000 (T.A.)		Obras de Drenaje	22.00	16.50	5.50				
		Pavimento	22.00	16.50	5.50				
a/ Obra cancelada por conflictos sociales									
b/ Obra autorizada en el 4to. trimestre y referendada para el 2007.									
Fuente de Financiamiento:									
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social									
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos									
Modalidad: Contrato									
Caminos Rurales									
Reconstrucción									
Las Margaritas									
Camino: E.C. (Carmen Villaflores - San Quintin) - La Esperanza - Poza Rica	Km.	Terracerías	23.60	11.80	11.80	100.00	2 500	Habitante	San Quintin, La Realidad, Guadalupe Tepeyac
Tramo: Km. 0+000 - Km. 31+000 (T.A.)		Obras de Drenaje	23.60	11.80	11.80				
Subtramo: Km. 7+400 - Km. 31+000 (T.A.)		Pavimento	23.60	11.80	11.80				
Caminos Rurales									
Reconstrucción									
Las Margaritas									
Camino: E.C. (Carmen Villaflores - San Quintin) - La Esperanza - Poza Rica	Km.	Terracerías	23.60	11.80	11.80	100.00	2 500	Habitante	San Quintin, La Realidad, Guadalupe Tepeyac
Tramo: Km. 0+000 - Km. 31+000 (T.A.)		Obras de Drenaje	23.60	11.80	11.80				
Subtramo: Km. 7+400 - Km. 31+000 (T.A.)		Pavimento	23.60	11.80	11.80				
Fuente de Financiamiento:									
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas									
Modalidad: Contrato									
Carreteras Alimentadoras									
Reconstrucción									
Comitán de Domínguez									
Camino: Comitán - Las Margaritas	Km.	Terracerías	18.00	2.70	2.70	a/ 30.00	123 195	Habitante	Comitán, Las Margaritas
Tramo: Km. 0+000 - Km. 18+000 (T.A.)		Obras de Drenaje	18.00	2.70	2.70				
		Pavimento	18.00	2.70	2.70				
a/ Obra cancelada por rescisión de contrato									



MUNICIPIO /OBRA /TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	PROGRAM. ANUAL	METAS		% AVAN FÍSICO. 4to.TRIM.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
				ALCAN. AL 3er.	TRIM. 4to.		TOTAL	TIPO	

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Modalidad: Contrato

Carreteras Alimentadoras									
Construcción									
Socoltenango									
Camino: Socoltenango - Soyatitán	Km.	Terracerías	1.00	0.00	1.00	100.00	17 889	Habitante	Varias
Tramo: Km. 0+000 - Km. 11+000		Subrasate	1.00	0.00	1.00				
Subtramo: Km. 4+000 - Km. 5+000		Obras de Drenaje	1.00	0.00	1.00				
		Base Hidráulica	1.00	0.00	1.00				
		Carpeta Asfáltica	1.00	0.00	1.00				
		Sello	1.00	0.00	1.00				
		Señalamiento	1.00	0.00	1.00				
Caminos Rurales									
Reconstrucción									
Las Margaritas									
Camino: Acceso a San Quintín	Km.	Terracerías	23.00	14.03	6.21	a/ 88.00	5 000	Habitante	La Realidad, Carmen Villaflores Nueva Providencia, Guadalupe Tepeyac
Tramo: Km. 0+000 - Km. 38+000 (T.A.)		Obras de Drenaje	23.00	14.03	6.21				
Subtramo: Km. 15+000 - Km. 38+000 (T.A.)		Pavimento	23.00	14.03	6.21				
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo									
Comitán de Domínguez									
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	Mantto. Correct.	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	10.00	8.00	2.00	100.00	51	Trabajador	Varias
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo									
Comitán de Domínguez									
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	Mantto. Prevent.	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	124.00	98.00	26.00	100.00	51	Trabajador	Varias
Mantenimiento y Reparación de Vehículos									
Comitán de Domínguez									
Mantenimiento y Reparación de Vehículos	Mantto. Correct.	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.00	4.00	1.00	100.00	18	Trabajador	Varias
Mantenimiento y Reparación de Vehículos									
Comitán de Domínguez									
Mantenimiento y Reparación de Vehículos	Mantto. Prevent.	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	65.00	55.00	10.00	100.00	18	Trabajador	Varias

a/ Obra autorizada en el 4to. trimestre y refrendada para el 2007.

REGIÓN IV FRAILESCA

MUNICIPIO /OBRA /TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	PROGRAM. ANUAL	METAS		% AVAN FÍSICO. 4to.TRIM.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
				ALCAN. AL 3er.	TRIM. 4to.		TOTAL	TIPO	

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos
Modalidad: Contrato

Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo									
Villaflores									
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	Mantto. Correct.	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	18.00	13.00	5.00	100.00	25	Trabajador	Varias
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo									
Villaflores									
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	Mantto. Prevent.	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	56.00	42.00	14.00	100.00	25	Trabajador	Varias
Mantenimiento y Reparación de Vehículos									
Villaflores									
Mantenimiento y Reparación de Vehículos	Mantto. Correct.	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6.00	4.00	2.00	100.00	20	Trabajador	Varias



MUNICIPIO /OBRA /TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	PROGRAM. ANUAL	METAS		% AVAN FÍSICO. 4to.TRIM.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
				ALCAN. AL 3er.	TRIM. 4to.		TOTAL	TIPO	
Mantenimiento y Reparación de Vehículos									
Villaflores									
Mantenimiento y Reparación de Vehículos	Mantto. Prevent.	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	76.00	52.00	24.00	100.00	20	Trabajador	Varias
Estudios y Proyectos									
Villaflores									
Camino: Paso Chiapaneco-Cauhtémoc									
Tramo: Km. 0+000-Km. 4+500	Km.	Estudio y Proyecto de Camino	4.50	4.065		100.00	3 850	Habitantes	Varias
Tramo: Km. 0+000-Km. 4+500	Km.	Estudio de Impacto Ambiental	4.50	0.00	4.065				
Puente S/N Km. 4+100 L.T. 15.0 m.l.	Proyecto	Estudio y Proyecto de Puente	1.00	1.00					
Estudios y Proyectos									
Villaflores									
Camino: Rizo de Oro - La Concordia - Ramal Ignacio Zaragoza	Km.	Estudio y Proyecto	8.00		8.00	100.00	10 068	Habitantes	Varias
Tramo: Km. 0+000- Km. 8+000	Km.	Estudio de Impacto Ambiental	8.00		8.00				

REGIÓN V NORTE

MUNICIPIO /OBRA /TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	PROGRAM. ANUAL	METAS		% AVAN FÍSICO. 4to.TRIM.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
				ALCAN. AL 3er.	TRIM. 4to.		TOTAL	TIPO	
Fuente de Financiamiento:									
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social									
Modalidad: Contrato									
Carreteras Alimentadoras									
Reconstrucción									
Pichucalco									
Camino: Pichucalco - Estación el Suspiro - Juárez	Km.	Terracerías	18.00	18.00		100.00	33 238	Habitante	Pichucalco, Juárez
Tramo: Km. 0+000 - Km. 18+000		Obras de Drenaje	18.00	18.00					
		Pavimento	18.00	18.00					
Juárez									
Camino: Estación Juárez - Santa Martha - Ostucán	Km.	Terracerías	55.20	1.10	54.10	100.00	21 644	Habitante	Estación Juárez, Santa Martha, Ostucán
Tramo: Km. 0+000 - Km. 55+200		Obras de Drenaje	55.20	1.10	54.10				
		Pavimento	55.20	1.10	54.10				
Pantepec									
Camino: Rayón - Pantepec - Tapalapa E.C. (Coapilla - Ocoatepec)	Km.	Terracerías	38.00	38.00		100.00	10 159	Habitante	Rayón, Pantepec
Tramo: Km. 0+000 - Km. 38+000 (T.A.)		Obras de Drenaje	38.00	38.00					
		Pavimento	38.00	38.00					
Simojovel									
Camino: Cate - Simojovel - Huitiupán	Km.	Terracerías	44.00	44.00		100.00	36 825	Habitante	Cate, Simojovel
Tramo: Km. 0+000 - Km. 44+000 (T.A.)		Obras de Drenaje	44.00	44.00					
		Pavimento	44.00	44.00					
Reforma									
Camino: Pichucalco - Reforma - Boca Limón	Km.	Terracerías	39.10	33.20	5.90	100.00	40 401	Habitante	Pichucalco, Reforma
Tramo: Km. 0+000 - Km. 57+100 (T.A.)		Obras de Drenaje	39.10	33.20	5.90				
Sub'tramo: Km. 18+000 - Km. 57+100		Pavimento	39.10	33.20	5.90				
Ostucán									
Camino: E.C. (Estación Juárez - Ostucán) - Nuevo Xochimilco - Peñitas	Km.	Terracerías	16.00	13.60	2.40	100.00	8 206	Habitante	Pichucalco, Reforma
Tramo: Km. 0+000 - Km. 16+000 (T.A.)		Obras de Drenaje	16.00	13.60	2.40				
		Pavimento	16.00	13.60	2.40				
Carreteras Alimentadoras									
Construcción									
Simojovel									
Camino: E.C.(Cate-Simojovel)-El Carrizal	Km.	Terracerías	0.885	0.885		100.00	36 825	Habitante	Varias
Tramo: Km. 0+000 - Km. 0+885		Obras de Drenaje	0.885	0.885					
		Sub'rasante	0.885	0.885					
		Base Hidráulica	0.885	0.133	0.752				
		Carpeta Asfáltica	0.885	0.00	0.885				
		Sello	0.885	0.00	0.885				
		Señalamiento	0.885	0.00	0.885				
Carreteras Alimentadoras									
Reconstrucción									
Amatán									
Camino: Amatán - La Esperanza - Zacajitc - Huitiupán	Km.	Terracerías	3.377	0.00	3.377	100.00	21 450	Habitante	San Francisco Jacona, San Antonio Jacona 2a. Sección
Tramo: Km. 0+000 - Km. 47+370		Obras de Drenaje	3.377	0.00	3.377				
Reconstruccion del Subtramo: km. 10+900 - Km. 14+277									
Caminos Rurales									
Construcción									
Tapilula									
Camino: E.C. (Tapilula - San Francisco Jacona) - San Antonio Jacona 2a. Seccion.	Km.	Terracerías	4.08	0.00	0.10	a/ 30.00	1 306	Habitante	San Francisco Jacona, San Antonio Jacona 2a. Sección
Tramo: Km. 0+000 - Km. 4+080		Obras de Drenaje	4.08	0.00	0.70				
		Revestimiento	4.08	0.00	0.00				



MUNICIPIO /OBRA /TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	PROGRAM. ANUAL	METAS			% AVAN FÍSICO. 4to.TRIM.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
				ALCAN. AL 3er.	TRIM. 4to.	TOTAL		TIPO		
Carreteras Alimentadoras										
Construcción										
Simojovel										
Camino: Simojovel - La Pimienta - San Andres Duraznal	Km.	Terracerías	4.51		4.51	100.00	36 825	Habitante	San Francisco Jacona, San Antonio Jacona	2a. Sección
Tramo. Km. 0+000 - Km. 23+887.10		Obras de Drenaje	4.51		4.51					
Sub'tramo. Km. 13+634 = Km. 14+000 - 15+746.26 = ((8+510 T.A.)		Sub'rasante	4.51		4.51					
		Base Hidráulica	4.51		4.51					
		Carpeta Asfáltica	4.51		4.51					
		Sello	4.51		4.51					
		Señalamiento	4.51		4.51					

a/ Obra autorizada en el 4to. trimestre y refrendada para el 2007.

Fuente de Financiamiento:**Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas****Modalidad: Contrato**

Carreteras Alimentadoras										
Construcción										
Francisco León										
Camino: Tecpatán - Azapac - Amatán - Francisco León (Viejo el Carmen)	Km.	Terracerías	2.30	2.30		100.00	11 842	Habitante	Varias	
Tramo. Km. 0+000 - Km. 36+420		Sub'rasante	2.30	2.30						
Sub'tramo: Km. 34+120 - Km. 36+420		Obras de Drenaje	2.30	2.30						
		Base Hidráulica	2.30	2.30						
		Carpeta Asfáltica	2.30	2.30						
		Sello	2.30	2.22	0.08					
		Señalamiento	2.30	0.00	2.30					
Francisco León										
Camino: Tecpatán - Azapac - Amatán - Francisco León (Viejo el Carmen)	Km.	Terracerías	0.70	0.70		100.00				
Tramo. Km. 0+000 - Km. 37+500		Sub'rasante	0.70	0.70						
Sub'tramo: Km. 30+400= Km.30+520 al Km. 34+000= Km. 34+120		Obras de Drenaje	1.80	1.80						
		Base Hidráulica	3.60	3.60						
		Carpeta Asfáltica	3.60	3.60						
		Sello	3.60	3.60						
		Señalamiento	3.60	3.60						
Simojovel										
Camino: Simojovel - San Andrés Duraznal	Km.	Terracerías	0.15	0.15		100.00	36 825	Habitante	Varias	
Tramo. Km. 0+000 - Km. 23+887.10		Obras de Drenaje	1.48	1.48						
Sub'tramo: Km. 20+380 - Km. 20+746 Km. 23+720 = Km. 23+887.10		Carpeta Asfáltica	2.97	2.97						
		Sello	2.97	2.97						
		Señalamiento	2.97	0.49	2.48					
Simojovel										
Camino: Simojovel-San Andrés Duraznal	Km.	Terracerías	2.97	1.93	1.04	100.00	36 825	Habitante	Varias	
Tramo. Km. 0+000 - Km. 23+887.1		Obras de Drenaje	2.97	0.00	2.97					
Subtramo: km. 20+380=Km. 20+746 al Km. 23+720= km. 23.887.10										
Simojovel										
Camino: Simojovel-San Andrés Duraznal	Km.	Terracerías	0.757		0.757	100.00	36 825	Habitante	Varias	
Tramo. Km. 0+000 - Km. 23+887.1		Derrumbes	8.60		8.60					
Subtramo: km. 0+000 - Km. (T.A) 8+600		Subrasante	0.757		0.757					
		Obras de Drenaje	0.25		0.25					
		Base Hidráulica	0.757		0.757					
		Carpeta Asfáltica	0.757		0.757					
		Sello	8.60		8.60					
		Señalamiento	8.60		8.60					
Carreteras Alimentadoras										
Reconstrucción										
Simojovel										
Construcción del Acceso al CECYT de Simojovel	Km.	Terracerías	0.70	0.00	0.70	100.00	36 825	Habitante	Simojovel	
Tramo. Km. 0+000 - Km. 0+700		Sub'rasante	0.70	0.00	0.70					
		Obras de Drenaje	0.70	0.00	0.70					
		Base Hidráulica	0.70	0.00	0.70					
		Carpeta Asfáltica	0.70	0.00	0.70					
		Sello	0.70	0.00	0.70					
		Señalamiento	0.70	0.00	0.70					

Fuente de Financiamiento:**Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas****Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)****Modalidad: Contrato**

Carreteras Alimentadoras										
Construcción										
Huitiupán										
Camino: Huitiupán - Amatán	M.L.	Aproches	218.10	109.05	109.05	100.00	23 525	Habitante	Varias	
Tramo. Km. 0+000 - Km. 47+370 (Via El Limón)										
Puente "Huitiupán" Km. 1+500										
Puente s/nombre Km. 15+000	M.L.	Aproches	40.00	40.00		100.00				



MUNICIPIO /OBRA /TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	PROGRAM. ANUAL	METAS		% AVAN FÍSICO. 4to.TRIM.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
				ALCAN. AL 3er.	TRIM. 4to.		TOTAL	TIPO	
Huitiupán		Reconstrucción							
Camino: Huitiupán - Amatán	Km.	Terracerías	0.60	0.60		100.00	23 525	Habitante	Varias
Tramo. Km. 0+000 - Km. 47+370 (Via El Limón)		Sub'rasante	0.60	0.60					
		Obras de Drenaje	0.60	0.60					
Reconstrucción del Subtramo:		Base Hidráulica	0.60	0.60					
Km. 7+000 - Km. 7+600 (T.A.)		Carpeta Asfáltica	0.60	0.33	0.27				
		Sello	0.60	0.00	0.60				
		Señalamiento	0.60	0.00	0.60				

Fuente de Financiamiento:

Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)

Modalidad: Contrato

Carreteras Alimentadoras									
Solosuchiapa		Construcción							
Camino: Solosuchiapa - Campamento La Trinidad	Km.	Terracerías	1.78	1.78		a/ 37.08	9 344	Habitante	Varias
Tramo. Km. 0+000 - Km. 1+780		Sub'rasante	1.78	1.78					
		Obras de Drenaje	1.78	1.07					
		Base Hidráulica	1.78	0.00					
		Carpeta Asfáltica	1.78	0.00					
		Sello	1.78	0.00					
		Señalamiento	1.78	0.00					
Ixhuatán		Construcción							
Camino: E.C. (Escopetazo - Pichucalco) - San Francisco Jacona	Km.	Terracerías	2.044	2.044		100.00	10 219	Habitante	Varias
Tramo. Km. 0+000 - Km. 2+044.11		Sub'rasante	2.044	2.044					
		Obras de Drenaje	2.044	2.044					
		Base Hidráulica	2.044	2.044					
		Carpeta Asfáltica	2.044	0.29	1.754				
		Sello	2.044	0.00	2.044				
		Señalamiento	2.044	0.00	2.044				
Francisco León		Construcción							
Camino: E.C. (Tecpatán - La Libertad - San José Maspac) - San Miguel La Sardina	Km.	Terracerías	2.00	2.00		100.00	6 246	Habitante	Varias
Tramo. Km. 0+000 - Km. 11+440		Sub'rasante	2.00	0.31	1.69				
Subtramo. Km. 0+000 - Km. 2+000		Obras de Drenaje	2.00	0.00	2.00				
		Base Hidráulica	2.00	0.00	2.00				
		Carpeta Asfáltica	2.00	0.00	2.00				
		Sello	2.00	0.00	2.00				
		Señalamiento	2.00	0.00	2.00				
Ixtapangajoya		Construcción							
Camino: Nicolás Bravo - La Gloria	Km.	Terracerías	1.50	1.50		100.00	5 437	Habitante	Varias
Tramo. Km. 0+000 - Km. 8+305.33		Sub'rasante	1.50	1.50					
Subtramo. Km. 0+000 - Km. 1+500		Obras de Drenaje	1.50	0.47	1.03				
		Base Hidráulica	1.50	0.00	1.50				
		Carpeta Asfáltica	1.50	0.00	1.50				
		Sello	1.50	0.00	1.50				
		Señalamiento	1.50	0.00	1.50				

a/ Obra cancelada por rescisión de contrato

Fuente de Financiamiento:

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)

Modalidad: Contrato

Carreteras Alimentadoras									
Sunuapa		Estudios y Proyectos							
Camino: Sunuapa-Ranchería Santa Cruz 3a. Sección									
Tramo: Km. 0+000-Km. 3+000	Km.	Estudios y Proyectos de Camino.	3.00	3.00		100.00	2 314	Habitantes	Varias
Tramo: Km. 0+000-Km. 3+000		Estudio de Impacto Ambiental	3.00	3.00					

Fuente de Financiamiento:

Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

Modalidad: Contrato

Carreteras Alimentadoras									
Amatán		Reconstrucción							
Camino: Amatán - La Esperanza - Zacajit - Huitiupán	Km.	Terracerías (Derrumbes)	14.277		14.277	100.00	21 450	Habitante	Solosuchiapa
Tramo: Km. 0+000 - Km. 47+370		Obras de Drenaje	14.277		14.277				
Reconstrucción									
Subtramo: Km. 0+000 - Km. 14+277 (T.A.)									
Pichucalco		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo							
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	Mantto. Correct.	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	28.00	21.00	7.00	100.00	80	Trabajador	Varias
Pichucalco		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo							
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	Mantto. Prevent.	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	176.00	125.00	51.00	100.00	80	Trabajador	Varias



MUNICIPIO /OBRA /TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	PROGRAM. ANUAL	METAS			% AVAN FÍSICO. 4to.TRIM.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
				ALCAN. AL 3er.	TRIM. 4to.	TOTAL		TIPO		
Mantenimiento y Reparación de Vehículos										
Pichucalco										
Mantenimiento y Reparación de Vehículos	Mantto. Correct.	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.00	8.00	4.00	100.00	22	Trabajador	Varias	
Mantenimiento y Reparación de Vehículos										
Pichucalco										
Mantenimiento y Reparación de Vehículos	Mantto. Prevent.	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	163.00	112.00	51.00	100.00	22	Trabajador	Varias	

REGIÓN VI SELVA

MUNICIPIO /OBRA /TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	PROGRAM. ANUAL	METAS			% AVAN FÍSICO. 4to.TRIM.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
				ALCAN. AL 3er.	TRIM. 4to.	TOTAL		TIPO		
<i>Fuente de Financiamiento:</i>										
<i>Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social</i>										
<i>Modalidad: Contrato</i>										
Carreteras Alimentadoras										
Reconstrucción										
Yajalón										
Camino: Temo - Yajalón -Tila - El Limar	Km.	Terracerías	46.70	46.70		100.00	31 236	Habitante	Temo, Chilón,	
Tramo: Km. 0+000 al Km. 86+700 (T.A)		Obras de Drenaje	46.70	46.70					Yajalón	
Sub'Tramo: Km. 40+000 al Km. 86+700 (T.A)		Pavimento	46.70	46.70						
Yajalón										
Camino: Temo - Yajalón -Tila - El Limar	Km.	Terracerías	40.00	40.00		100.00	31 236	Habitante	Temo, Chilón,	
Tramo: Km. 0+000 al Km. 86+700 (T.A)		Obras de Drenaje	40.00	40.00					Yajalón	
Sub'tramo: Km. 0+000 - Km. 40+000 (T.A)		Pavimento	40.00	40.00						
Salto de Agua										
Camino: El Limar-Campanario-Salto de Agua	Km.	Terracerías	37.30	33.20	4.10	100.00	57 551	Habitante	Salto de Agua,	
Tramo: Km. 0+000 Km. 37+300 (T.A)		Obras de Drenaje	37.30	33.20	4.10				Campanario,	
		Pavimento	37.30	33.20	4.10				Nuevo Limar	
Salto de Agua										
Camino: Salto de Agua - Paso el Naranjo	Km.	Terracerías	10.00	10.00		100.00	57 551	Habitante	Salto de Agua,	
Tramo: Km. 0+000 al Km. 10+000 (T.A)		Obras de Drenaje	10.00	10.00					Paso el Naranjo	
		Pavimento	10.00	10.00						
Salto de Agua										
Camino: Salto de Agua E.C. (Villahermosa-Mérida)	Km.	Terracerías	6.20	6.20		100.00	57 551	Habitante	Salto de Agua	
Tramo: Km. 0+000 al Km. 17+500 (T.A)		Obras de Drenaje	6.20	6.20						
Tramo: Km. 0+000 al Km. 6+200 (T.A)		Pavimento	6.20	6.20						
Limite Estado de Tabasco										
Salto de Agua										
Camino: Francisco I. Madero - Salto de Agua	Km.	Terracerías	36.20	36.20		100.00	57 551	Habitante	Salto de Agua,	
Tramo: Francisco I. Madero - Paso El Naranjo		Obras de Drenaje	36.20	36.20					Suclumpa,	
Km. 0+000 al Km. 36+200 (T.A)		Pavimento	36.20	36.20					El Toro	
Salto de Agua										
Camino: La Trinidad - Paso el Naranjo	Km.	Terracerías	15.60	15.60		100.00	57 551	Habitante	La Trinidad, El	
Tramo: Km. 0+000 al Km. 15+600 (T.A)		Obras de Drenaje	15.60	15.60					Chival, Paso el	
		Pavimento	15.60	15.60					Naranjo	

Fuente de Financiamiento:
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)
Modalidad: Contrato

Carreteras Alimentadoras										
Construcción										
Palenque										
Camino: La Libertad - La Placa - Estación	Km.	Terracerías	1.514	1.514		100.00	97 722	Habitante	Varias	
Lacandón-Pakal Na		Obras de Drenaje Transversal	1.514	1.514						
Tramo: Km. 0+000 al Km. 45+414 (T.A)		Sub'rasante	1.514	1.514						
Sub'tramo: km. 40+900-Km. 42+414		Base Hidráulica	1.514	1.514						
		Carpetas Asfálticas	1.514	0.000	1.514					
		Obras de Drenaje Complementarias	1.514	0.000	1.514					
		Sello	1.514	0.000	1.514					
		Señalamiento	1.514	0.000	1.514					



MUNICIPIO /OBRA /TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	PROGRAM. ANUAL	METAS		% AVAN FÍSICO. 4to.TRIM.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
				ALCAN. AL 3er.	TRIM. 4to.		TOTAL	TIPO	
Carreteras Alimentadoras Construcción									
La Libertad Camino: La Libertad-Aldama-La Placa Tramo: km. 0+000-Km. 20+500 Puentes S/N km.10+852; Km. 11+310, y Km. 11+566.50	M.L.	Aproches	358.00	358.00		100.00	5 901	Habitante	La Libertad

Fuente de Financiamiento:

M.- Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)

P.- Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)

Modalidad: Contrato

Carreteras Alimentadoras Reconstrucción									
Benemérito de las Américas Camino: Ramal a Flor de Cacao Tramo: Km. 0+000 al Km. 4+500 (T.A)	Km.	Terracerías	4.50	4.50		100.00	19 158	Habitante	Varias
		Obras de Drenaje	4.50	4.50					
		Base Hidráulica	4.50	4.50					
		Carpeta Asfáltica	4.50	4.50					

Fuente de Financiamiento:

Z.- Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

Modalidad: Contrato

Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo									
Palenque Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	Mantto. Correct.	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	36.00	28.00	8.00	100.00	79	Trabajador	Varias
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo									
Palenque Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	Mantto. Prevent.	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	160.00	120.00	40.00	100.00	79	Trabajador	Varias
Mantenimiento y Reparación de Vehículos									
Palenque Mantenimiento y Reparación de Vehículos	Mantto. Correct.	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12.00	9.00	3.00	100.00	32	Trabajador	Varias
Mantenimiento y Reparación de Vehículos									
Palenque Mantenimiento y Reparación de Vehículos	Mantto. Prevent.	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	163.00	123.00	40.00	100.00	32	Trabajador	Varias
Estudio y Proyecto									
Palenque Camino: La Libertad - Aldama - La Placa - Estación Lacandón E.C. (Pakaina - La Libertad) Tramo: Km. 43+500 - Km. 45+414	Km.	Estudio y Proyecto	1.91	1.91		100.00	3 974	Habitante	Varias

REGIÓN VII SIERRA

MUNICIPIO /OBRA /TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	PROGRAM. ANUAL	METAS		% AVAN FÍSICO. 4to.TRIM.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
				ALCAN. AL 3er.	TRIM. 4to.		TOTAL	TIPO	
Carreteras Alimentadoras Construcción									
La Independencia Camino: Independencia-Siltepec-Buenos Aires Tramo: Km. 0+000-Km. 36+500 Puente Losa y Paso Provisional Km. 4+500 de 105.0 M. L.	M.L.	Puente Losa Paso Provisional	105.00 105.00	105.00 105.00		100.00	46 423	Habitante	La Concordia La Independencia

Fuente de Financiamiento:

Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)

Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

Modalidad: Contrato



MUNICIPIO /OBRA /TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	PROGRAM. ANUAL	METAS		% AVAN FÍSICO. 4to.TRIM.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
				ALCAN. AL 3er.	TRIM. 4to.		TOTAL	TIPO	

Fuente de Financiamiento:

Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

Modalidad: Contrato

		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo							
Motozintla									
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	Mantto. Correct.	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	8.00	7.00	1.00	100.00	22	Trabajador	Varias
		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo							
Motozintla									
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	Mantto. Prevent.	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	44.00	38.00	6.00	100.00	22	Trabajador	Varias
		Mantenimiento y Reparación de Vehículos							
Motozintla									
Mantenimiento y Reparación de Vehículos	Mantto. Correct.	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	6.00	4.00	2.00	100.00	18	Trabajador	Varias
		Mantenimiento y Reparación de Vehículos							
Motozintla									
Mantenimiento y Reparación de Vehículos	Mantto. Prevent.	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	76.00	50.00	26.00	100.00	18	Trabajador	Varias

REGIÓN VIII SOCONUSCO

MUNICIPIO /OBRA /TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	PROGRAM. ANUAL	METAS		% AVAN FÍSICO. 4to.TRIM.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
				ALCAN. AL 3er.	TRIM. 4to.		TOTAL	TIPO	

Fuente de Financiamiento:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Modalidad: Contrato

		Carreteras Alimentadoras Reconstrucción							
Mapastepec									
Camino: Ramal a Mapastepec - E.C. (Arriaga - Tapachula)	Km.	Terracerías	3.20	0.74	2.46	100.00	42 789	Habitante	Varias
		Obras de Drenaje	3.20	0.74	2.46				
Tramo: Km. 0+000-Km. 3+200		Pavimento	3.20	0.74	2.46				

Fuente de Financiamiento:

Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

Modalidad: Contrato

		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo							
Tapachula									
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	Mantto. Correct.	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	48.00	39.00	9.00	100.00	55	Trabajador	Varias
		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo							
Tapachula									
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	Mantto. Prevent.	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	60.00	50.00	10.00	100.00	55	Trabajador	Varias
		Mantenimiento y Reparación de Vehículos							
Tapachula									
Mantenimiento y Reparación de Vehículos	Mantto. Correct.	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	10.00	6.00	4.00	100.00	37	Trabajador	Varias
		Mantenimiento y Reparación de Vehículos							
Tapachula									
Mantenimiento y Reparación de Vehículos	Mantto. Prevent.	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	152.00	87.00	65.00	100.00	37	Trabajador	Varias
		Caminos Rurales Conservación							
Cobertura Regional									
Programa de conservación de caminos rurales	Km.	Conservación	72.70	0.00	72.70	100.00	50 000	Habitante	Varias



REGIÓN IX ISTMO-COSTA

MUNICIPIO /OBRA /TRAMO	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO / CONCEPTO DE LA OBRA	PROGRAM. ANUAL	METAS		% AVAN FÍSICO. 4to.TRIM.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
				ALCAN. AL 3er.	TRIM. 4to.		TOTAL	TIPO	
Fuente de Financiamiento:									
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social									
Modalidad: Contrato									
Carreteras Alimentadoras									
Construcción									
Pijijiapan									
Camino: E.C. La Costera - Ejido Tamaulipas (Estación Joaquín Amaro)	Km.	Terracerías	1.42	1.42		100.00	51 085	Habitante	Varias
Tramo: Km. 0+000 al Km. 5+040		Obras de Drenaje	1.42	1.42					
Sub'tramo: Km. 2+200 al Km. 3+620		Sub'rasante	1.42	0.62	0.80				
		Base Hidráulica	1.42	0.00	1.42				
		Carpeta Asfáltica	1.42	0.00	1.42				
		Sello	1.42	0.00	1.42				
		Señalamiento	1.42	0.00	1.42				
Fuente de Financiamiento:									
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos									
Modalidad: Contrato									
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo									
Tonalá									
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	Mantto. Correct.	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	10.00	8.00	2.00	100.00	22	Trabajador	Varias
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo									
Tonalá									
Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	Mantto. Prevent.	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria Pesada y Equipo	44.00	36.00	8.00	100.00	22	Trabajador	Varias
Mantenimiento y Reparación de Vehículos									
Tonalá									
Mantenimiento y Reparación de Vehículos	Mantto. Correct.	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	4.00	3.00	1.00	100.00	18	Trabajador	Varias
Mantenimiento y Reparación de Vehículos									
Tonalá									
Mantenimiento y Reparación de Vehículos	Mantto. Prevent.	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	53.00	35.00	18.00	100.00	18	Trabajador	Varias
Liberación del Deracho de Via (Gastos de Operación)									
Arriaga - Ocozocoautla de Espinosa									
Autopista: Ocozocoautla - Arriaga	Km.		10.68	5.00	5.68	100.00	600 000	Ejidatarios y Pequeños Propietarios	Varias
Tramo: Km. 0+000 - Km. 93+400									

Proyecto: Coordinar la ejecución de los programas de infraestructura carretera a cargo de la Comisión de Caminos.

El titular de la Comisión de Caminos, brindó 130 audiencias con presidentes municipales, autoridades ejidales, habitantes en general y contratistas y asistió a 17 recorridos a obras de infraestructura carretera en diferentes Municipios del Estado; asimismo, se recibieron y turnaron para su contestación 750 solicitudes y propuestas en materia de infraestructura carretera, beneficiando con estas acciones a 358 hombres y 244 mujeres, para un total de 602 personas.

Proyecto: Planear, programar y presupuestar la infraestructura carretera, permitiendo el desarrollo social y económico del Estado.

Se revisaron y tramitaron 29 cédulas de validación de acciones, liberándose los recursos presupuestales en tiempo y forma; se realizó una reunión del grupo estratégico, se elaboraron, integraron y tramitaron 3 informes de avances físico-financieros de los programas de inversión; se brindó apoyo logístico para la celebración de 2 sesiones del Consejo de

Administración, beneficiando con estas acciones a 54 hombres y 12 mujeres para un total de 66 personas.

Proyecto: Seguimiento al procedimiento de tramitación, evaluación y ejecución de la obra con apego a las leyes que norman a la obra pública.

Para otorgar seguimiento a las propuestas de inversión de la Comisión de Caminos a efecto de que se cumpla con los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Chiapas 2001-2006, se brindaron 20 asesorías para la revisión, integración de la información presentada por las diversas áreas de trabajo de oficinas centrales y delegaciones regionales, correspondiente al Sistema de Entrega y Recepción de la Administración Pública Estatal (SERAPE); se tramitó y dio seguimiento a 65 solventaciones de auditorías de obras en procesos y de ejercicios anteriores en los diferentes programas, y se realizaron 4 actas de obras circunstanciadas, beneficiándose con estas acciones un total de 36 personas, 30 hombres y 6 mujeres.



Proyecto: Asesoría y atención jurídica legal en las actividades de la Entidad, de acuerdo a las políticas y normas de comunicación.

Con la finalidad de proporcionar a la Entidad asesoría jurídica legal en todas las actividades internas o con otras Dependencias Estatales, Federales o Municipales y en el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos que en materia de comunicaciones establezcan las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos; se elaboraron y tramitaron 5 acuerdos del Consejo de Administración; se tramitaron 7 procedimientos de afectación de fianza; se dio tramitación, seguimiento y conclusión a 6 procedimientos administrativos ante la Contraloría General; se dio seguimiento a 3 procesos de amparos; se dio procedimiento a un trámite de recuperación de maquinaria pesada, beneficiándose con estas acciones a 12 hombres y 11 mujeres para un total de 23 personas.

Proyecto: Revisar y tramitar lo referente a licitación, contratación y estimaciones de Obra Pública.

Con el objetivo de eficientar el proceso de licitación, contratación y revisión de estimaciones, en el 4º trimestre del 2006, se elaboraron 242 contratos de obras públicas con empresas y personas físicas; asimismo, se recepcionaron y tramitaron 308 estimaciones de obra, beneficiándose con estas acciones a 17 personas, entre ellas a 13 hombres y 4 mujeres.

Proyecto: Elaborar, validar y tramitar estudios y proyectos de caminos y puentes.

En el cuarto trimestre del 2006, se elaboraron y validaron 107 estudios y proyectos de caminos y puentes, 105 expedientes técnicos de obra; 243 estimaciones y finiquitos de obra y 2 de impacto ambiental; asimismo, se llevaron a cabo 52 supervisiones de control de calidad de suelos en obras de caminos y puentes, con lo cual se apoyó la supervisión del proceso constructivo de la obra pública, beneficiándose así a 17 hombres y una mujer para un total de 18 personas.

Proyecto: Supervisión, ejecución y control de caminos rurales y puentes.

Con la finalidad de realizar una supervisión eficiente de las obras de caminos rurales y puentes para que se ejecuten de acuerdo al proyecto; se revisaron y tramitaron 3 expedientes técnicos para liberación de los recursos presupuestales, así como 4 finiquitos de obras de trabajos ejecutados y se revisaron 3 estimaciones de obras, beneficiando con estas acciones a 21 personas, conformadas por 17 hombres y 4 mujeres.

Proyecto: Consolidación y modernización de la infraestructura carretera hacia las cabeceras municipales en el Estado.

Con la finalidad de vigilar y supervisar que la ejecución y desarrollo de las obras, se realicen de acuerdo a los proyectos ejecutivos, normas y especificaciones establecidas y programas de obras; en el 4º trimestre del 2006, se revisaron y tramitaron 22 finiquitos de obras; se revisaron y tramitaron para su pago 64 estimaciones de obra de construcción de carreteras hacia las cabeceras municipales, beneficiándose con estas acciones a 9 personas, entre ellas a 8 hombres y una mujer.

Proyecto: Administrar los recursos financieros, en la construcción, conservación y modernización de la infraestructura carretera.

Se elaboraron y tramitaron 238 expedientes técnicos de obras, dentro de los diferentes programas: Programa Normal de Gobierno del Estado (PNGE), Fideicomiso para la Infraestructura Social en los Estados (FISE), Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (PAFEF), Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas (CONAPI), Fondo Nacional para Desastres Naturales (FONDEN) y CONVENIOS PEMEX; se llevaron a cabo 151 actos y actas de entrega-recepción de obras concluidas; se realizaron 175 actas de finiquitos de obras concluidas; asimismo, se efectuaron visitas de campo para la generación de 574 estimaciones de avances de obras en proceso para su respectivo pago; se llevaron a cabo 3 mil 17 supervisiones de obras aún en proceso de ejecución, se beneficiaron con estas acciones a 689 personas, de las cuales 647 hombres y 42 mujeres.

Proyecto: Estructurar programas de mantenimiento y mejoramiento del parque de maquinaria y vehículos.

Se realizaron 111 mantenimientos correctivos y 6 servicios a talleres al parque vehicular y de maquinaria pesada; manteniendo en buen estado la maquinaria y los vehículos para la supervisión y control de calidad de las obras, beneficiándose con estas acciones a 34 hombres y 6 mujeres para un total de 40 personas.

Proyecto: Conservación de la infraestructura carretera en el Estado, de acuerdo a las especificaciones técnicas.

Con la finalidad de diagnosticar y evaluar permanentemente la situación actual que guarda la infraestructura de la red estatal de caminos pavimentados; se realizaron 75 supervisiones y verificaciones de obras; se revisaron y tramitaron 111 estimaciones de volúmenes de obras y 27 finiquitos; se



elaboró un expediente técnico, de daños físicos en la infraestructura carretera; se elaboraron 6 reportes de avances físico-financiero de las obras, se revisaron y tramitaron 27 finiquitos de obras, beneficiándose con estas acciones a 50 personas, entre ellas a 46 hombres y 4 mujeres.

Proyecto: Plantear y formular estrategias de infraestructura vial, para el mejoramiento y ordenamiento de los espacios urbanos.

Se elaboraron y tramitaron 7 expedientes técnicos, para liberación de los recursos presupuestales, se elaboraron

6 informes del seguimiento del ejercicio del gasto de las obras en proceso; asimismo, se llevaron a cabo 144 supervisiones de obras, verificando el proceso de ejecución de las obras, con el objetivo de mantener en condiciones óptimas de operación y servicio la infraestructura urbana vial, ampliar y modernizar la infraestructura carretera existente, beneficiándose con estas acciones a 15 hombres y 10 mujeres para un total de 25 personas.

UNIDAD RESPONSABLE DE APOYO: Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza

ACCIONES Y RESULTADOS

PROGRAMAS REALIZADOS OCTUBRE - DICIEMBRE 2006

REGION VI SELVA

MUNICIPIOS	PROGRAMAS REALIZADOS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGR. ANUAL	METAS ALCANZADAS TRIM		% AVAN FÍSICO 4to. TRIM	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
				AL 3er.	4to.		TOTAL	TIPO	
<i>Fuente de Financiamiento:</i>									
<i>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</i>									
URBANIZACIÓN									
Tumbalá	Construcción de Calles	M ²	4 020	2 400	1 620	100.00	886	Persona	Esperanza Porvenir y Joloniel

SUBFUNCIÓN: PUERTOS

DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas

ACCIONES Y RESULTADOS

OBRAS REALIZADAS OCTUBRE - DICIEMBRE 2006

REGIÓN VIII SOCONUSCO

MUNICIPIO / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO/CONCEPTO DE LA OBRA	METAS ALCANZADAS AL			% AVAN FÍSICO 4to. TRIM.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA	
			PROGRAM. ANU AL	3er.	TRIM. 4to.		TOTAL	TIPO		
<i>Fuente de Financiamiento:</i>										
<i>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados(FIES)</i>										
Tapachula	Parque Temático para el Muelle de Cruceros	Obra	Construcción	1	1	100.00	304 337	Habitante	Puerto Madero	
<i>Fuente de Financiamiento:</i>										
<i>Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados(FIES)</i>										
<i>Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos</i>										
Tapachula	Construcción de Terminal de Muelle de Cruceros	Obra	Construcción	1	0.50	0.50	100.00	304 337	Habitante	Puerto Madero
Tapachula	Puerto Chiapas	Obra	Construcción	1	1	100.00	304 337	Habitante	Puerto Madero	



MUNICIPIO / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO/CONCEPTO DE LA OBRA	METAS			% AVAN FÍSICO 4to. TRIM.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGRAM.ANU AL	ALCANZADAS AL 3er.	TRIM.4to.		TOTAL	TIPO	

Fuente de Financiamiento:
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados(FIES)
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

Tapachula		Construcción							
Recinto Fiscalizado	Obra	Edificio de oficinas de la aduana y terracerías; sistema de electrificación, nave industrial, circuito cerrado de televisión, enmallado perimetral del recinto; obra civil, alumbrado público, electrificación en media tensión, instalación hidráulica exterior, red de alcantarillado sanitario, red alcantarillado pluvial, obra telefonía, vialidad principal y secundaria, puente de acceso, pago de estudios y derechos	1	0.25	0.74	a/ 99.00	304 337	Habitante	Tapachula de Córdoba y Ordóñez

a/ El proyecto se referendará para el 2007.

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

Tapachula		Construcción							
Puerto Chiapas	Lote	Indemnización de bienes distintos a la tierra	1		1	100.00	304 337	Habitante	Puerto Madero

SUBFUNCIÓN: AEROPUERTOS

DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas

ACCIONES Y RESULTADOS

OBRAS REALIZADAS OCTUBRE - DICIEMBRE 2006

REGIÓN I CENTRO

MUNICIPIO/OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO/CONCEPTO DE LA OBRA	METAS			% AVAN FÍSICO 4to. TRIM.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGRAM.ANU AL	ALCANZADAS AL 3er.	TRIM.4to.		TOTAL	TIPO	

Fuente de Financiamiento:
Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados(FIES)
Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF)
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

Chiapa de Corzo		Construcción							
Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo	Obra	Construcción de línea de media tensión para el suministro de energía eléctrica	1	0.59	0.41	100.00	64 023	Habitante	Estado

SUBFUNCIÓN: COMUNICACIONES

DEPENDENCIA: Secretaría de Obras Públicas

ACCIONES Y RESULTADOS

OBRAS REALIZADAS OCTUBRE - DICIEMBRE 2006

REGIÓN I CENTRO

MUNICIPIO/OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	TIPO/CONCEPTO DE LA OBRA	METAS			% AVAN FÍSICO 4to. TRIM.	BENEFICIARIOS		COMUNIDAD BENEFICIADA
			PROGRAM.ANU AL	ALCANZADAS AL 3er.	TRIM.4to.		TOTAL	TIPO	

Fuente de Financiamiento:
Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

Tuxtla Gutiérrez		Construcción							
Construcción del Edificio del Sistema de Radio y Televisión	Obra	Elevador y cuarto de máquina	1		1	100.00	507 070	Habitante	Tuxtla Gutiérrez



SUBFUNCIÓN: TRANSPORTE

SUBDEPENDENCIA: Coordinación de Transportes, Tránsito y Vialidad

ACCIONES Y RESULTADOS

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

Proyecto: Coordinar e impulsar la política del transporte público.

Para reordenar y modernizar el transporte en todas sus modalidades se llevaron a cabo 5 sesiones públicas, realizándose la regularización de concesiones, cesión de derechos entre particulares, cambios de modalidad, reposición y ampliación de concesión, llevándose a cabo: una en cada uno de los municipios de Acala, La Libertad, La Trinitaria y 2 en San Cristóbal de las Casas.

Asimismo, se realizaron 317 estudios socioeconómicos en los Municipios solicitantes del servicio del transporte público en las siguientes modalidades: 122 taxis, 31 combis, un autobús, 4 microbuses, 3 bicitaxis, 10 mototaxis, 3 pipas, 42 volteos, 7 de bajo tonelaje, 21 triciclos, 7 de transporte escolar, un centro de aprendizaje de conducción vehicular y 65 mixtos, de los cuales fueron: 3 en Acala, 15 en Berriozábal, 2 en Suchiapa y 57 en Tuxtla Gutiérrez, de la Región Centro; 20 en Acapetahua, 6 en Huehuetán, uno en Mapastepec, 28 en Tapachula y uno en Tuxtla Chico de la Región Soconusco; 51 en Amatlán y uno en Francisco León de la Región Norte; uno en Amatenango de la Frontera de la Región Sierra; 36 en Comitán de Domínguez, 2 en Frontera Comalapa, uno en La Trinitaria y 7 en Tzitol de la Región Fronteriza; uno en cada uno de los municipios de La Concordia, Villa Corzo y Villaflores de la Región Frailesca; 2 en La Libertad y 80 en Palenque de la Región Selva; así como 4 estudios de factibilidad y ofertamiento de rutas en los municipios de: Comitán de Domínguez, Villaflores, Tapachula y Arriaga, en beneficio de 332 mil 850 personas, de las cuales 164 mil 160 son hombres y 168 mil 690 mujeres.

Proyecto: Dar seguimiento al cumplimiento de las políticas del transporte público.

Se llevaron a cabo 5 sesiones públicas en los siguientes municipios: una en Acala de la Región Centro, una en la Libertad de la Región Selva, 2 en San Cristóbal de las Casas de la Región Altos y una en La Trinitaria de la Región Fronteriza; en las que se realizaron la regularización de concesiones, cesión de derechos entre particulares, cambios de modalidad, reposición y ampliación de concesión, con estas acciones se beneficiaron a 100 mil 870 habitantes, de los cuales 51 mil 629 son mujeres y 49 mil 241 hombres.

Proyecto: Dirigir y controlar las políticas del transporte público desde las representaciones regionales y registrar y controlar a las unidades vehiculares del transporte público.

Se atendieron 209 demandas de los transportistas concesionados y usuarios del transporte quienes realizaron sus quejas y denuncias por medio de oficios o vía telefónica, en las que manifestaron las irregularidades de los prestadores del servicio público como: prestar el servicio de manera irregular (pirata), circular con placas sobrepuestas, no respetar los itinerarios o rutas autorizadas, invasión de rutas, maltrato al usuario, exceso de pasaje, entre otras.

Se levantaron 366 boletas de infracción correspondientes a 2 mil 740 unidades revisadas en las modalidades de: 929 taxis, un mil 394 combis, 239 microbuses, 17 autobuses, 93 volteos, 15 de transporte escolar, 3 pipas y 50 mixtos; y se realizaron 209 operativos de supervisión, consistentes en la revisión física y documental a las unidades vehiculares, los cuales se realizaron: 92 en Tuxtla Gutiérrez, 20 en Comitán de Domínguez, 5 en cada uno de los municipios de Las Margaritas y Ocosingo, 2 en cada uno de los municipio de Siltepec, Yajalón y Altamirano, 38 en San Cristóbal de las Casas, 40 en Tapachula y uno en cada uno de los municipios de Socoltenango, Tuxtla Chico y Villa Comaltitlán.

Se tramitaron 182 órdenes de emplacamiento a las unidades vehiculares concesionadas, beneficiando a igual número de personas de los municipios de: Acala, Berriozábal, Cintalapa, Chiapa de Corzo, Jiquipilas, Ocozacoautla de Espinosa, Tecpatán, Tuxtla Gutiérrez, de la Región Centro; Chenalhó, San Cristóbal de las Casas, Larráinzar, Chamula, Tenejapa, de la Región Altos; Comitán de Domínguez, Chicomuselo, Frontera Comalapa, La Independencia y Las Margaritas, de la Región Fronteriza; Pichucalco, Reforma, Solosuchiapa, de la Región Norte; Benemérito de las Américas, Palenque, Salto de Agua, Tumbalá, Catazajá de la Región Selva; Motozintla, Amatenango de la Frontera y Bella Vista de la Región Sierra; Cacahoatán, Mapastepec, Tapachula y Villa Comaltitlán de la Región Soconusco; y Pijijiapan y Tonalá de la Región Istmo – Costa.

Asimismo, se expidieron 368 permisos los cuales fueron en la modalidad de: 145 de ruta urbana, 209 ruta foránea, 14 de zona en los municipios de: Tuxtla Gutiérrez, Tecpatán, Acala, Berriozábal, Coapilla, Copainalá, Totolapa, Ixtapa, Ocozacoautla de Espinosa, Suchiapa, San Fernando, Venustiano Carranza y Ocoatepec de la Región Centro; San Cristóbal de las Casas de la Región Altos; Comitán de Domínguez, Frontera Comalapa, Las Margaritas y Tzitol de la Región Fronteriza; Ángel Albino Corzo de la Región



Frailesca; El Bosque, Huitiupán, Ixtacomitán, Juárez, Pichucalco, Simojovel y Bochil, de la Región Norte; Chilón, Ocosingo, Salto de Agua, Sabanilla y Tila de la Región Selva; Motozintla de la Región Sierra; Escuintla, Mapastepec, Tapachula, Tuxtla Chico y Villa Comaltitlán de la Región Soconusco; Tonalá y Huixtla, de la Región Istmo – Costa; así como 8 permisos de sustitución en Tuxtla Gutiérrez, beneficiándose con estas acciones a 783 mil 868 personas, de las cuales 380 mil 12 son hombres y 403 mil 856 mujeres.

Proyecto: Otorgar el concesionamiento del transporte público en el Estado.

Se atendieron y revisaron 575 solicitudes de concesión, las cuales cumplieron con los requisitos que marca la Ley de Transportes; 17 amparos los cuales fueron interpuestos por diferentes quejosos, los cuales se ventilan en los juzgados del Estado; asimismo, se entregaron 91 autorizaciones del transporte especial en las modalidades de: 17 de bicitaxi, un mototaxi, 20 de grúa, 20 de triciclo, 15 de transporte escolar, 15 de pipa y 3 centros de aprendizaje de conducción vehicular, en los municipios de Acala, Tuxtla Gutiérrez, Suchiapa y Tecpatán de la Región Centro; Comitán de Domínguez, Frontera Comalapa y La Trinitaria de la Región Fronteriza; Villaflores de la Región Frailesca; Reforma de la Región Norte; Tapachula, Mapastepec, Escuintla y Acapetahua de la Región Soconusco; Tonalá de la Región Istmo - Costa; con los cuales se beneficiaron a 98 mil 809 habitantes de las cuales fueron 49 mil 252 mujeres y 49 mil 557 hombres.

Proyecto: Optimizar los recursos informáticos, proporcionando asesoría y apoyo técnico en el desarrollo de actividades sustantivas.

Se realizó la impresión de 300 concesiones en las modalidades de: 84 mixtos, 8 combis, 135 taxis, 13 de bajo tonelaje, 59 volteos y uno de carga general; además de 69 autorizaciones del transporte privado correspondientes a: 12 de transporte escolar, 16 bicitaxis, 22 triciclos, un mototaxi, 2 grúas, 15 pipas, un centro de aprendizaje de conducción de vehículos; así también, se imprimieron 29 gafetes del transporte privado, en las modalidades de: 9 bicitaxis y 20 triciclos, beneficiando a 398 personas de las cuales 299 son hombres y 99 mujeres.

DEPENDENCIA: Secretaría de Comunicaciones y Transportes

ACCIONES Y RESULTADOS

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

Proyecto: Promoción para el Desarrollo de la Comunicación y el Transporte en el Estado.

El Secretario de Comunicaciones y Transportes, sostuvo 2 reuniones de trabajo con el Ejecutivo Estatal para la atención de los siguientes asuntos: Integración de programas estratégicos para la atención del sector transportista, de acuerdo a las minutas de trabajo firmados por el Ejecutivo del Estado con los líderes transportistas y particulares de los diversos Municipios del Estado y 5 reuniones de trabajo, 4 con funcionarios de esta Secretaría para definir e instrumentar los proyectos estratégicos que se ejecutarán para promover el desarrollo de la comunicación y el transporte en el Estado, y una con representantes transportistas en la cual fue presentado el C. Secretario de Comunicaciones y Transportes, así como para comunicarles las estrategias del Ejecutivo del Estado para el cumplimiento de acciones prioritarias en materia de transporte.

DEPENDENCIA: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

ACCIONES Y RESULTADOS

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Participaciones e Incentivos

Proyecto: Modernización del Servicio del Transporte de pasajeros urbano y rural del Estado.

Se autorizaron recursos para este proyecto para regularizar el préstamo otorgado por la Tesorería del Estado a esta Secretaría, para otorgar 53 apoyos a los transportistas concesionados en el Estado; con la finalidad de proporcionar seguridad y orientación a los usuarios de los servicios públicos y concesionados, beneficiando con estas acciones a una población de 4 millones 475 mil 388 habitantes de los cuales 2 millones 198 mil 319 son hombres y 2 millones 277 mil 69 son mujeres.




EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

2001 - 2006

(Millones de Pesos)

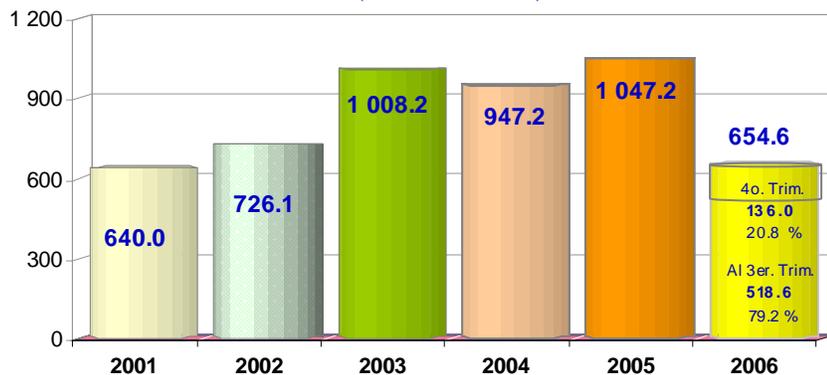

Fuente: Organismos Públicos del Gobierno del Estado
